



Sorocaba, 20 de maio de 2022.

Of.Nº 0012/22

Exmo. Sr. **Sergio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref.: Contrato 061/2018

<u>PROTOCOLO</u>
Recebido em <u>20/05/22</u>
Nome <u>Marcius Augusto Pereira</u>
Assinatura <u>Coordenador Especial</u>

Assunto: Medição dos Eventos de Construção de Sinalização Horizontal e Vertical no Corredor Demais Eixos.

Prezado Senhor,

O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar os arquivos de medição do Marco M52, correspondente aos Eventos de Sinalização Horizontal e Vertical no Corredor Demais Eixos, conforme eventograma pactuado entre as partes.


De Acordo com a cláusula vigésima sexta de nosso contrato de concessão, os serviços executados fazem parte do cronograma de cumprimento da obrigação de subvenção aos investimentos constantes do Anexo VII do contrato de concessão.

Diante do exposto solicitamos aprovação dos eventos relacionados acima e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.


Anexo:

Boletim de Medição 26.1 (M52)

Atenciosamente,



Carlos Eduardo Cavalcante de Oliveira
Responsável Técnico



Manoel Roberto Magalhães Ferreira
Diretor Superintendente



BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SUBVENÇÃO 26.1

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - CORREDOR
DEMAIS EIXOS

Índice:


1. Boletim de Medição Eventograma.....	3
1.1 Planilha de Eventos e Serviços.....	6
2. Relatório de Obras.....	11
2.1 Relatório Fotográfico.....	14
3. ART/SCPO.....	21
4. Atestado de Qualidade.....	29
5. Croquis de Projetos.....	33

1.1 BOLETIM DE MEDIÇÃO EVENTOGRAMA

Mês de medição e pagamento	%	Recursos da Caixa Econômica Federal (R\$)	Recursos da Prefeitura (R\$)
M01	0,00%	0,00	0,00
M02	0,00%	0,00	0,00
M03	0,00%	0,00	0,00
M04	2,00%	2.544.123,97	133.901,26
M05	0,00%	0,00	0,00
M06	0,00%	0,00	0,00
M07	0,00%	0,00	0,00
M08	3,30%	4.197.804,56	220.937,07
M09	0,50%	636.030,99	33.475,32
M10	0,50%	636.030,99	33.475,32
M11	0,00%	0,00	0,00
Subtotal	6,30%	8.013.990,51	421.788,97
M12	0,20%	254.412,41	13.390,11
M13	0,00%	0,00	0,00
M14	0,00%	0,00	0,00
M15	0,00%	0,00	0,00
M16	0,20%	254.412,40	13.390,12
M17	0,00%	0,00	0,00
M18	0,00%	0,00	0,00
M19	0,40%	508.824,79	26.780,26
M20	1,70%	2.162.505,37	113.816,08
M21	0,00%	0,00	0,00
M22	4,75%	6.042.294,43	318.015,49
M23	0,00%	0,00	0,00
Subtotal	7,25%	9.222.449,40	485.392,06
M24	0,00%	0,00	0,00
M25	0,00%	0,00	0,00
M26	2,00%	2.544.123,97	133.901,26
M27	0,00%	0,00	0,00
M28	0,60%	763.237,19	40.170,38
M29	4,10%	5.215.454,14	274.497,58
M30	6,70%	8.522.815,31	448.569,22
M31	11,00%	13.992.681,83	736.456,94
M32	5,60%	7.123.547,11	374.923,53
M33	4,00%	5.088.247,94	267.802,52
M34	4,00%	5.088.247,93	267.802,54
M35	0,00%	0,00	0,00
Subtotal	38,00%	48.338.355,42	2.544.123,97
M36	5,20%	6.614.722,34	348.143,27
M37	3,65%	4.643.026,24	244.369,81
M38	10,15%	12.911.429,13	679.548,93
M39	0,40%	508.824,79	26.780,26
	0,55%	699.634,09	36.822,85
M40	0,00%	0,00	0,00
M41	0,60%	763.237,19	40.170,38
M42	0,00%	0,00	0,00
M43	0,00%	0,00	0,00
M44	0,15%	190.809,30	10.042,59

Mês de medição e pagamento	%	Recursos da Caixa Econômica Federal (R\$)	Recursos da Prefeitura (R\$)
M45	0,00%	0,00	0,00
M46	1,30%	1.653.680,58	87.035,82
M47	0,00%	0,00	0,00
Subtotal	22,00%	27.985.363,66	1.472.913,91
M48	0,00%	0,00	0,00
M49	1,50%	1.908.092,98	100.425,94
M50	0,00%	0,00	0,00
M51	0,00%	0,00	0,00
M52	0,30%	381.618,60	20.085,18
M53	1,50%	1.908.092,98	100.425,94
M54	1,50%	1.908.092,98	100.425,94
M55	1,50%	1.908.092,98	100.425,94
M56	2,40%	3.052.948,77	160.681,50
M57	2,30%	2.925.742,57	153.986,44
M58	3,20%	4.070.598,35	214.242,02
M59	12,25%	15.582.759,27	820.145,27
Subtotal	26,45%	33.646.039,48	1.770.844,17
Total	100,00%	127.206.198,47	6.695.063,08
		133.901.261,55	


Data: 20/05/2022



Manoel R. Magalhães Ferreira
Diretor Superintendente
BRT Sorocaba



João Paulo Vilela Pereira
GPO - Sistran
Certificadora




Sérgio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente
URBES

1.1 PLANILHA DE EVENTOS E SERVIÇOS


Marco / Evento	Proporção	Valores (R\$)
M01	0,00%	0,00
M02	0,00%	0,00
M03	0,00%	0,00
M04	2,00%	2.544.123,97
PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS	2,00%	
M05	0,00%	0,00
M06	0,00%	0,00
M07	0,00%	0,00
M08	3,30%	4.197.804,56
LICENÇA DE INSTALAÇÃO	1,00%	
PROJETOS DOS TERMINAIS - VITÓRIA RÉGIA / N. MANCHESTER / SÃO BENTO	1,80%	
EST. E PROJETOS - CORREDOR BRT ITAVUVU	0,50%	
M09	0,50%	636.030,99
EST. E PROJETOS - CORREDOR BRT OESTE	0,50%	
M10	0,50%	636.030,99
EST. E PROJETOS - CORREDOR BRT IPANEMA	0,50%	
M11	0,00%	0,00
M12	0,20%	254.412,41
EST. E PROJETOS - DEMAIS CORREDORES ESTRUTURAIIS (LESTE, SUL E DEMAIS EIXOS)	0,20%	
M13	0,00%	0,00
M14	0,00%	0,00
M15	0,00%	0,00
M16	0,20%	254.412,40
CORREDOR SUL - INSTALAÇÃO DOS ABRIGOS DOS PONTOS DE PARADA	0,20%	
M17	0,00%	0,00
M18	0,00%	0,00
M19	0,40%	508.824,79
CORREDOR SUL - REFORMA DOS PASSEIOS	0,40%	
M20	1,70%	2.162.505,37
CORREDOR BRT ITAVUVU - CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO TRECHO 01	1,70%	
M21	0,00%	0,00
M22	4,75%	6.042.294,43
CORREDOR BRT ITAVUVU - CONSTRUÇÃO DO 1º CONJUNTO DE 3 ESTAÇÕES	2,00%	
CORREDOR BRT ITAVUVU - CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO TRECHO 02	1,50%	
TERMINAL V. RÉGIA - FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA E INSTALAÇÃO DA COBERTURA	1,25%	
M23	0,00%	0,00
M24	0,00%	0,00
M25	0,00%	
M26	2,00%	2.544.123,97
CORREDOR BRT ITAVUVU - CONSTRUÇÃO DO 2º CONJUNTO DE 3 ESTAÇÕES	2,00%	
M27	0,00%	
M28	0,60%	763.237,19
CORREDOR SUL - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RÍGIDO NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 01	0,60%	


Marco / Evento	Proporção	Valores (R\$)
M29	4,10%	5.215.454,14
CORREDOR BRT ITAVUVU - CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO TRECHO 04	1,50%	
CORREDOR BRT ITAVUVU - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGENS E RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 01	1,10%	
TERMINAL VITÓRIA RÉGIA - LIMPEZA DO TERRENO, TERRAPLANAGEM, EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE GUIAS E EXECUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO	1,50%	
M30	6,70%	8.522.815,31
CORREDOR BRT ITAVUVU - CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO TRECHO 03	1,50%	
CORREDOR BRT ITAVUVU - CONSTRUÇÃO DO 4º CONJUNTO DE 3 ESTAÇÕES	1,90%	
CORREDOR ITAVUVU - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 02	1,05%	
CORREDOR SUL - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RÍGIDO NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 02	0,60%	
TERMINAL V. RÉGIA - CONSTRUÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	1,65%	
M31	11,00%	13.992.681,83
CORREDOR BRT ITAVUVU - CONSTRUÇÃO DO 3º CONJUNTO DE 3 ESTAÇÕES	2,00%	
CORREDOR BRT ITAVUVU - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGENS E RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 03	1,05%	
CORREDOR BRT ITAVUVU - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 04	1,05%	
CORREDOR BRT ITAVUVU - REFORMA DOS PASSEIOS NOS TRECHOS 1 E 2	0,90%	
CORREDOR BRT IPANEMA - CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO DO TRECHO 01	2,00%	
CORREDOR LESTE - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RÍGIDO NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 03	0,80%	
CORREDOR SUL - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RÍGIDO NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 03	0,60%	
CORREDOR SUL - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RÍGIDO NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 04	0,60%	
CORREDOR SUL - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,40%	
DEMAIS EIXOS - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RÍGIDO NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 02	0,65%	
TERMINAL V. RÉGIA - SINALIZAÇÃO, INSTALAÇÕES GERAIS, PAISAGISMO, MOBILIÁRIO, COMUNICAÇÃO E ITS; SERVIÇOS COMPLEMENTARES, LIMPEZA E ENTREGA	0,95%	
M32	5,60%	7.123.547,11
CORREDOR BRT ITAVUVU - REFORMA DOS PASSEIOS NOS TRECHOS 3 E 4	0,95%	
CORREDOR BRT ITAVUVU - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA	2,40%	
CORREDOR LESTE - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RÍGIDO NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 02	0,80%	
CORREDOR LESTE - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RÍGIDO NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 04	0,80%	
DEMAIS EIXOS - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RÍGIDO NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 3	0,65%	
M33	4,00%	5.088.247,94
CORREDOR BRT IPANEMA - CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO DO TRECHO 02	2,00%	
CORREDOR BRT IPANEMA - CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO DO TRECHO 03	2,00%	
M34	4,00%	5.088.247,93
CORREDOR BRT IPANEMA - CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO DO TRECHO 04	2,00%	
CORREDOR BRT IPANEMA - REFORMA DOS PASSEIOS DOS TRECHOS 01 E 02	1,00%	
CORREDOR LESTE - REFORMA DOS PASSEIOS	0,65%	



Marco / Evento	Proporção	Valores (R\$)
CORREDOR LESTE - INSTALAÇÃO DOS ABRIGOS DOS PONTOS DE PARADA	0,35%	
M35	0,00%	0,00
M36	5,20%	6.614.722,34
CORREDOR BRT IPANEMA - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 02	1,10%	
CORREDOR BRT IPANEMA - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 03	1,10%	
CORREDOR BRT IPANEMA - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 04	1,10%	
CORREDOR BRT IPANEMA - REFORMA DOS PASSEIOS DOS TRECHOS 03 E 04	1,00%	
TERMINAL SÃO BENTO - LIMPEZA DO TERRENO, TERRAPLENAGEM, EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE GUIAS E EXECUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO	0,90%	
M37	3,65%	4.643.026,24
CORREDOR BRT IPANEMA - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 01	1,10%	
TERMINAL S. BENTO - FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA E INSTALAÇÃO DA COBERTURA	0,75%	
DEMAIS EIXOS - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RÍGIDO NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 01	0,60%	
CORREDOR LESTE - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RÍGIDO NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 01	0,80%	
CORREDOR LESTE - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,40%	
M38	10,15%	12.911.429,13
TERMINAL S. BENTO - CONSTRUÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, PISOS E PASSEIOS	1,00%	
TERMINAL S. BENTO - SINALIZAÇÃO, INSTALAÇÕES GERAIS, PAISAGISMO, MOBILIÁRIO, COMUNICAÇÃO E ITS; SERVIÇOS COMPLEMENTARES, LIMPEZA E ENTREGA	0,55%	
CORREDOR BRT IPANEMA - CONSTRUÇÃO DO 1º CONJUNTO DE 3 ESTAÇÕES	1,80%	
CORREDOR BRT IPANEMA - CONSTRUÇÃO DO 2º CONJUNTO DE 3 ESTAÇÕES	1,90%	
CORREDOR BRT IPANEMA - CONSTRUÇÃO DO 3º CONJUNTO DE 2 ESTAÇÕES	1,20%	
CORREDOR BRT IPANEMA - CONSTRUÇÃO DO 4º CONJUNTO DE 2 ESTAÇÕES	1,20%	
CORREDOR BRT IPANEMA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA	2,50%	
M39	0,95%	1.208.458,88
DEMAIS EIXOS - INSTALAÇÃO DOS ABRIGOS DOS PONTOS DE PARADA	0,40%	
DEMAIS EIXOS - REFORMA DOS PASSEIOS	0,55%	
M40	0,00%	0,00
M41	0,60%	763.237,19
DEMAIS EIXOS - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RÍGIDO NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 04	0,60%	
M42	0,00%	0,00
M43	0,00%	0,00
M44	0,15%	190.809,30
CORREDOR SUL - INSTALAÇÃO DE ITS	0,15%	
M45	0,00%	0,00
M46	1,30%	1.653.680,58
CORREDOR BRT IPANEMA - INSTALAÇÃO DE ITS NAS ESTAÇÕES	1,30%	
M47	0,00%	0,00
M48	0,00%	0,00
M49	1,50%	1.908.092,98

Marco / Evento	Proporção	Valores (R\$)
CORREDOR BRT ITAVUVU - INSTALAÇÃO DE ITS NAS ESTAÇÕES	1,50%	
M50	0,00%	0,00
M51	0,00%	0,00
M52	0,30%	381.618,60
DEMAIS EIXOS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,30%	
M53	1,50%	1.908.092,98
CORREDOR BRT OESTE - CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO TRECHO 04	1,50%	
M54	1,50%	1.908.092,98
CORREDOR BRT OESTE - CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO TRECHO 03	1,50%	
M55	1,50%	1.908.092,98
CORREDOR BRT OESTE - CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO TRECHO 02	1,50%	
M56	2,40%	3.052.948,77
CORREDOR BRT OESTE - CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO TRECHO 01	1,60%	
CORREDOR BRT OESTE - REFORMA DOS PASSEIOS DOS TRECHOS 3 E 4	0,80%	
M57	2,30%	2.925.742,57
CORREDOR BRT OESTE - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 01	1,05%	
CORREDOR LESTE - INSTALAÇÃO DE ITS	0,15%	
DEMAIS EIXOS - INSTALAÇÃO DE ITS	0,15%	
CORREDOR BRT OESTE - CONSTRUÇÃO DO 1º CONJUNTO DE 3 ESTAÇÕES	0,95%	
M58	3,20%	4.070.598,35
CORREDOR BRT OESTE - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 02	1,00%	
CORREDOR BRT OESTE - CONSTRUÇÃO DO 2º CONJUNTO DE 3 ESTAÇÕES	0,95%	
TERMINAL N. MANCHESTER - FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA E INSTALAÇÃO DA COBERTURA	1,25%	
M59	12,25%	15.582.759,27
CORREDOR OESTE - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 03	1,00%	
TERMINAL N. MANCHESTER - LIMPEZA DO TERRENO, TERRAPLANAGEM, EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE GUIAS E EXECUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO	1,60%	
CORREDOR BRT OESTE - REFORMA DOS PASSEIOS DOS TRECHOS 1 E 2	0,80%	
CORREDOR BRT OESTE - CONSTRUÇÃO DO 3º CONJUNTO DE 2 ESTAÇÕES	0,95%	
CORREDOR BRT OESTE - CONSTRUÇÃO DO 4º CONJUNTO DE 2 ESTAÇÕES	0,70%	
TERMINAL N. MANCHESTER - SINALIZAÇÃO, INSTALAÇÕES GERAIS, PAISAGISMO, MOBILÁRIO, COMUNICAÇÃO E ITS; SERVIÇOS COMPLEMENTARES, LIMPEZA E ENTREGA	0,90%	
CORREDOR BRT OESTE - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA	2,40%	
TERMINAL N. MANCHESTER - CONSTRUÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, PISOS E PASSEIOS	1,65%	
CORREDOR BRT OESTE - INSTALAÇÃO DE ITS NAS ESTAÇÕES	1,30%	
CORREDOR BRT OESTE - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 04	0,95%	
TOTAL		127.206.198,47


 Manoel R. Magalhães Ferreira
 Diretor Superintendente
 BRT Sorocaba


 João Paulo Vilela Pereira
 GPO - Sistran
 Certificadora


 Sérgio David Rosumek Barreto
 Diretor Presidente
 URBS

2. RELATÓRIO DE OBRAS



URBES
TRÁNSITO E TRANSPORTES

IMPLANTAÇÃO BRT



Evento:	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - CORREDOR DEMAIS EIXOS	Início da obra	01/07/2020	Término da obra	20/12/2021
Prazo total da obra:	Jul/20 a Dez/21	Tempo decorrido	537	Saldo de prazo	0
Trecho:	Corredor Demais Eixos	Estaca Inicial	N/A	Estaca Final	N/A
Responsável técnico:	Carlos Eduardo Cavalcante de Oliveira CREA: 5070370304				
Responsável técnico:	Wu Yan Ming - CREA: 0600940240				
Data:	20/12/2021	Dia da semana	D S X T X Q X Q X S X S X		
Responsável	Carlos Eduardo Cavalcante de Oliveira CREA: 5070370304				
Serviços:	Sinalização Horizontal e Vertical no Corredor Demais Eixos				

Gráfico de Precipitação



Descrição:
Gráfico de Precipitação (Fonte: INMET): Pouca incidência de chuvas no início do 2º Trimestre de 2021 na região de Sorocaba.

MANHÃ	NA			
TARDE	NA			
NOITE	x			

Tarefas realizadas

Descrição

Serviços de Sinalização Horizontal e Vertical - DEMAIS EIXOS:

- 1) Pintura horizontal de faixas e lombadas;
- 2) Implantação/Substituição de Placas de Sinalização.

Observações Fiscalização

Equipe envolvida

Código	Descrição	Quantidade utilizada
	Ajudante	4
	Oficial	2
	Encarregado	2

Equipamentos utilizados

Código	Descrição	Quantidade utilizada
	Caminhão de Sinalização	2
	Máquina extrusora a quente	2

BRT Sorocaba

Certificadora
João P. V. Pereira
Ger. Contrato
CREA Nº 5069811282-SP

URBES/PMS

José Mendes Netto
Engenheiro Civil
CREA 060182887-6

2.1 RELATÓRIO

FOTOGRAFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Sorocaba 20/05/2022

Execução dos Serviços

Relatório de Vistoria dos Serviços de Sinalização Horizontal e Vertical do Corredor Demais Eixos.



09/07/2021

Foto 01


Marcação da pintura horizontal na Av. Comendador Oeterrer



12/09/2021

Foto 02

Marcação da pintura horizontal na Av. Comendador Oeterrer

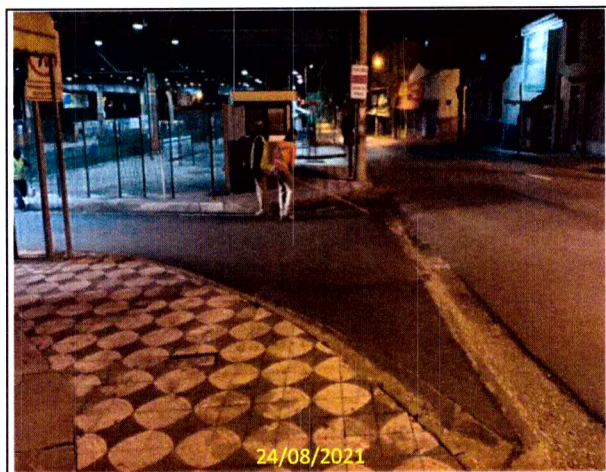

24/08/2021

Foto 03

Marcação da pintura no acesso ao Terminal São Paulo



02/08/2020

Foto 04

Sinalização horizontal da Avenida General Osório



Visto

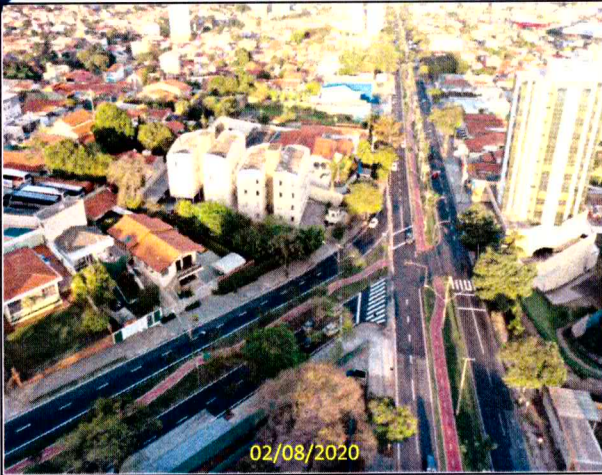


Foto 05
Sinalização horizontal da Av. G. Osório com a Adhemar de Barros

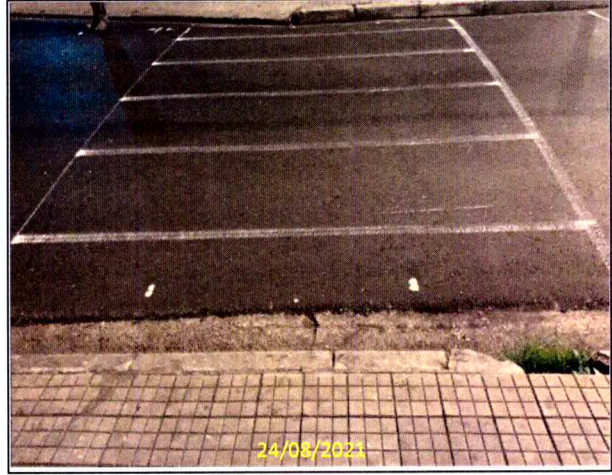


Foto 06
Marcação da pintura de uma travessia de Pedestres Rua Francisco Scarpa



Foto 07
Marcação da sinalização da Av. Luiz Ferraz de Sampaio Jr.



Foto 08
Marcação da sinalização da Av. Luiz Ferraz de Sampaio Jr.



Foto 09
Marcação da Sinalização do acesso ao Term. São Paulo



Foto 10
Marcação da Sinalização do acesso ao Term. São Paulo



Visto





24/08/2021

Foto 11
Sinalização na Avenida Afonso Vergueiro

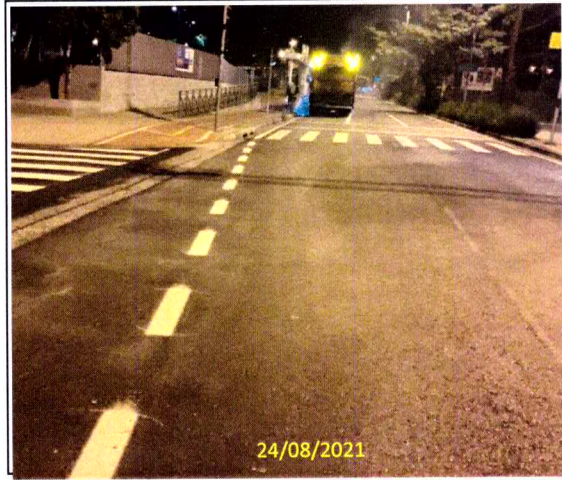

24/08/2021

Foto 12
Sinalização na Avenida Afonso Vergueiro



29/06/2021

Foto 13
Sinalização na Avenida Afonso Vergueiro



12/09/2021

Foto 14
Sinalização na Avenida Hermelino Matarazzo



12/09/2021

Foto 15
Sinalização na Avenida Hermelino Matarazzo



12/09/2021

Foto 16
Sinalização na Avenida Hermelino Matarazzo

Visto





Foto 17
Sinalização na Avenida Hermelino Matarazzo



Foto 18
Sinalização na Avenida Hermelino Matarazzo



Foto 19
Sinalização na Avenida Hermelino Matarazzo



Foto 20
Sinalização na Avenida Hermelino Matarazzo



Foto 21
Sinalização na Avenida Hermelino Matarazzo



Foto 22
Sinalização na Avenida Hermelino Matarazzo

Visto





12/09/2021

Foto 23
Av Com. Oeterer Integração com Viaduto JJ Lacerda



12/09/2021

Foto 24
Sinalização na Avenida Comendador Oeterer



12/09/2021

Foto 25
Sinalização na Avenida Comendador Oeterer



12/09/2021

Foto 26
Sinalização na Avenida Comendador Oeterer



12/09/2021

Foto 27
Sinalização na Avenida Comendador Oeterer



12/09/2021

Foto 28
Sinalização na Avenida Comendador Oeterer


Visto





Foto 29
Sinalização na Avenida Comendador Oeterer



Foto 30
Sinalização na Avenida Comendador Oeterer



Foto 31
Sinalização na Avenida Comendador Oeterer



Foto 32
Sinalização Rua Araçoiaba com a Comendador Oeterer



Foto 33
Sinalização na R. Dr. Álvaro Soares



Foto 34
Sinalização na R. Dr. Álvaro Soares

Visto





Foto 35
Sinalização na Rua Dr. Luiz Ferraz de Sampaio Jr.



Foto 36
Sinalização na Rua Dr. Luiz Ferraz de Sampaio Jr.



Foto 37
Sinalização na Rua Francisco Scarpa



Foto 38
Sinalização na Rua Francisco Scarpa



Foto 39
Instalação de Tachões



Foto 40
Sinalização na Rua Sete de Setembro

Visto





12/09/2021

Foto 41
Sinalização na Santa Clara




12/09/2021

Foto 42
Sinalização na Rua Santa Clara



12/09/2021

Foto 43
Sinalização na Av. Moreira César

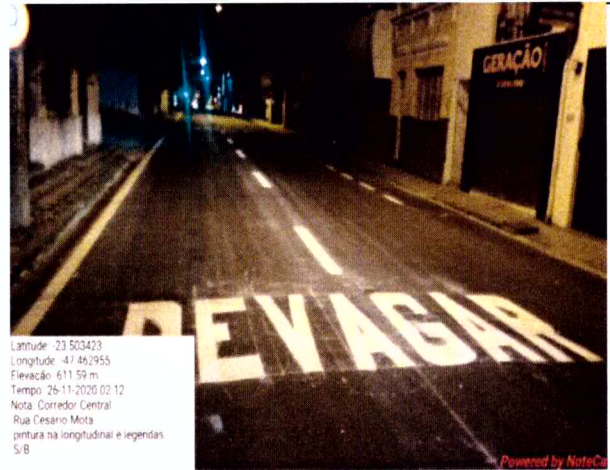

Latitude: -23.503423
Longitude: -47.462955
Elevação: 611.59 m
Tempo: 26-11-2020 02:12
Nota: Corredor Central
Rua Cesário Mota
pintura na longitudinal e legendas
S/B

Powered by NoteGe

Foto 44
Execução de Sinalização Horizontal na rua Cesário Mota

Descrição do Serviços Executados:

- Pintura de sinalização horizontal
- Instalação de placas de sinalização
- Instalação de Tachões



3. ART / SCPO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230211347947

Substituição- modificação do objeto do contrato ou
atividade técnica contratada à 28027230210650611

1. Responsável Técnico

CARLOS EDUARDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **2618061640**

Registro: **5070370304-SP**

Empresa Contratada: **BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A.**

Registro: **2194315-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A.001** CPF/CNPJ: **25.224.614/0001-88**

-88

Nº:

540

Endereço: **Avenida ANTÔNIO CARLOS COMITRE**

Complemento: **SALA 45**

Bairro: **PARQUE CAMPOLIM**

Cidade: **Sorocaba**

UF: **SP**

CEP: **18047-620**

Contrato:

Celebrado em: **09/02/2018**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **300.000.000,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida COMENDADOR GENÉSIO RODRIGUES**

Nº:

Complemento: **TERMINAL SÃO BENTO**

Bairro: **CAGUASSU**

Cidade: **Sorocaba**

UF: **SP**

CEP: **18072-858**

Data de Início: **04/02/2019**

Previsão de Término: **16/07/2021**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infraestrutura**

Código:

Proprietário: **BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

CPF/CNPJ: **25.224.614/0001-88**

Endereço: **Avenida IPANEMA**

Nº:

Complemento: **CORREDOR IPANEMA E ESTAÇÕES**

Bairro: **JARDIM PLANALTO**

Cidade: **Sorocaba**

UF: **SP**

CEP: **18070-631**

Data de Início: **30/06/2020**

Previsão de Término: **02/02/2022**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infraestrutura**

Código:

Proprietário: **BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

CPF/CNPJ: **25.224.614/0001-88**

Endereço: **Avenida ITAVUVU**

Nº:

Complemento: **CORREDOR ITAVUVU E ESTAÇÕES**

Bairro: **JARDIM SANTA CECÍLIA**

Cidade: **Sorocaba**

UF: **SP**

CEP: **18078-005**

Data de Início: **01/10/2020**

Previsão de Término: **02/02/2022**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infraestrutura**

Código:

Proprietário: **BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A**

CPF/CNPJ: **25.224.614/0001-88**

Endereço: **Avenida ANTÔNIO CARLOS COMITRE**

Nº:

Complemento: **CORREDOR ESTRUTURAL SUL**

Bairro: **PARQUE CAMPOLIM**

Cidade: **Sorocaba**

UF: **SP**

CEP: **18047-620**

Data de Início: **01/07/2020**

Previsão de Término: **22/09/2021**

Coordenadas Geográficas:

Handwritten mark

Finalidade: Infraestrutura	Código:
Proprietário: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A.	CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88
Endereço: Rua ANTÔNIO SILVA SALADINO	N°:
Complemento: TERMINAL VITÓRIA RÉGIA	Bairro: PARQUE VITÓRIA RÉGIA
Cidade: Sorocaba	UF: SP CEP: 18078-344
Data de Início: 04/02/2019	
Previsão de Término: 02/02/2022	
Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: Infraestrutura	Código:
Proprietário: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A.	CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88
Endereço: Avenida DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO	N°:
Complemento: TERMINAL NOVA MANCHESTER	Bairro: JARDIM VERA CRUZ
Cidade: Sorocaba	UF: SP CEP: 18050-000
Data de Início: 04/02/2019	
Previsão de Término: 02/02/2022	
Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: Infraestrutura	Código:
Proprietário: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A.	CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Direção de Obra				
1	Direção	Edificação de Materiais Mistos	6746,75000	metro quadrado
Elaboração				
2	Projeto executivo	Sistema Viário	1791,74000	metro quadrado
	Projeto executivo	Terminal Modal	2619,05000	metro quadrado
	Projeto executivo	Terminal Modal	3459,15000	metro quadrado
	Projeto executivo	Sistema Viário	1040,04000	metro quadrado
	Projeto executivo	Terminal Modal	3527,95000	metro quadrado
Execução				
3	Execução	Edificação de Materiais Mistos	6746,75000	metro quadrado
	Execução	Pavimento Rígido	9065,00000	metro
	Gerenciamento	Sistemas de Telecomunicação	1,00000	unidade
	Gerenciamento	Sistema de Trânsito Urbano	1,00000	unidade
	Execução	Pavimento Flexível (CBUQ)	2759,00000	metro
	Execução	Pavimento Flexível (CBUQ)	9540,00000	metro
	Execução	Pavimento Rígido	2759,00000	metro
	Execução	Edificação	4162,03000	metro quadrado
	Execução	Estrutura esquadrias metálicas	125775,88000	quilograma
	Execução	Edificação	3527,95000	metro quadrado
	Execução	Pavimento Flexível (CBUQ)	11000,00000	metro
	Execução	Pavimento Rígido	850,00000	metro
	Execução	Edificação	3745,83000	metro quadrado
	Execução	Estrutura esquadrias metálicas	77744,50000	quilograma
	Projeto executivo	Sistema Viário	1040,04000	metro quadrado
	Projeto executivo	Terminal Modal	3459,15000	metro quadrado
	Projeto executivo	Terminal Modal	2619,05000	metro quadrado
	Execução	Pavimento Rígido	12214,00000	metro

u

Execução 3	Execução	Pavimento Flexível (CBUQ)	12235,00000	metro cúbico
	Execução	Estrutura esquadrias metálicas	86296,40000	quilograma
	Execução	Pavimento Rígido	1400,00000	metro
	Execução	Pavimento Flexível (CBUQ)	7400,00000	metro
	Execução	Estrutura	113198,30000	quilograma
	Projeto executivo	Sinalização Viária	1607,46000	metro quadrado
	Execução	Edificação	9801,80000	metro quadrado
	Projeto executivo	Sinalização Viária	1791,74000	metro quadrado
	Projeto executivo	Sistema Viário	1607,46000	metro quadrado
	Projeto executivo	Terminal Modal	3527,95000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução dos serviços, incl. os serviços: Estações BRT Ipanema c/ área constr. 4.162,03 m² e estrutura metálica c/ 125.775,88 kg - Estações BRT Oeste c/ área constr. 3.745,83 m² e estrutura metálica c/ 113.198,30 kg - Terminal São Bento com área constr. 10.880 m² e estrutura metálica com 86.296,40 kg - Terminal Vila Nova Manchester com área constr. 9.801,80 m² e estrutura metálica com 77.744,50 kg - Corredor Ipanema: pavimento Rígido 12.214,00 m pav. flexível 12.235,00 metros - Corredor Oeste: pav. Rígido 9.065,00m pav. flexível 9.540,00 m - Corredor Estrutural Leste: pav. Rígido 1.400,00 m (pontos de parada), pav. flexível 11.000,00 m - Estrutural Binário Comendador: pav. Rígido 2.759,00 m pav. flexível 2.759,00 m Corredor Área Central: pav. Rígido (pontos de parada) 850,00 m pav. flexível 7.400,00 m. Corredor Estrutural Sul - Execução e gerenciamento do Sistema de Trânsito e Sistema de Telecomunicação. Incluindo resp técnica p/ implantação do sistema de ITS (Intelligent Transporte Systems).

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS - ABENC

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Sorocaba 17 de Setembro de 2021

Local

data

CARLOS EDUARDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 335.426.268-05

BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE
S.A.001-88 - CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confec.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel. 0800 017 18 11
E-mail: acessarlink@creasp.org.br Fale conosco do site acima



Valor ART R\$ 88,78

Registrada em: 17/09/2021

Valor Pago R\$ 88,78

Nosso Número: 28027230211347947

Versão do sistema

Impresso em: 20/09/2021 09:38:43



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
28027230200725003

1. Responsável Técnico

WU YAN MING

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2604908824

Registro: 0600940240-SP

Empresa Contratada: **VISUAL SINALIZACAO VIARIA E CONSTRUCOES LTDA**

Registro: 0513788-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: **BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A.** CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

Endereço: **Avenida ANTÔNIO CARLOS COMITRE** N°: 540

Complemento: **SALA 45, 4º ANDAR**

Bairro: **PARQUE CAMPOLIM**

Cidade: **Sorocaba**

UF: **SP**

CEP: 18047-620

Contrato: **185/2020**

Celebrado em: **01/06/2020**

Vinculada à Art n°:

Valor: R\$ **3.072.126,77**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida ANTONIO CARLOS COMITRE** N°: 540

Complemento: **SALA 45, 4º ANDAR**

Bairro: **PARQUE CAMPOLIM**

Cidade: **Sorocaba**

UF: **SP**

CEP: 18047-620

Data de Início: **01/07/2020**

Previsão de Término: **01/07/2021**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Execução 1	Instalação	Sinalização Vertical	526,60000	metro quadrado
	Instalação	Sinalização Vertical	405,00000	unidade
	Instalação	Sinalização Horizontal	66657,56000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO HORIZONTAL E VERTICAL DEFINITIVA NAS OBRAS REALIZADAS PELA CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE SOROCABA DENOMINADAS CORREDOR IPANEMA, CORREDOR BINÁRIO, CORREDOR OESTE, CORREDOR CENTRAL, CORREDOR GENERAL, CORREDOR ESTRUTURAL LESTE, CORREDOR ESTRUTURAL SUL, EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS PROJETOS APRESENTADOS PELA CONTRATANTE.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Guarulhos 03 de Setembro de 2020

Local

data

WU YAN MING - CPF: 006.212.158-80

BRT BOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A. - CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 17 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$ 233,94

Registrada em: 01/07/2020

Valor Pago R\$ 233,94

Nosso Número: 28027230200725003 Versão do sistema

Impresso em: 17/08/2020 09:40:26



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230211230332

1. Responsável Técnico

FERNANDO AUGUSTO QUEIROZ SIMONCINI

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **2608638368**

Registro: **5061736616-SP**

Empresa Contratada: **F.F.L. SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP**

Registro: **2032140-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A.**

CPF/CNPJ: **25.224.614/0001-88**

Endereço: **Rua DOUTOR CAMPOS SALLES**

Nº: **900**

Complemento:

Bairro: **VILA ASSIS**

Cidade: **Sorocaba**

UF: **SP**

CEP: **18025-000**

Contrato: **268/2021**

Celebrado em: **07/06/2021**

Vinculada à Art nº:

Valor: **R\$ 657.281,81**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua COMENDADOR OETTERER**

Nº:

Complemento:

Bairro: **VILA CARVALHO**

Cidade: **Sorocaba**

UF: **SP**

CEP: **18060-070**

Data de Início: **14/08/2021**

Previsão de Término: **14/10/2021**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade	
Execução	1	Execução	Sinalização Horizontal	1,00000	unidade
		Execução	Sinalização Vertical	1,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Prestação de serviços profissionais especializados para pintura, instalação e fornecimento de placas de sinalização horizontal e vertical em estrita conformidade com os projetos apresentados pela contratante e nos valores e quantidades constantes nas propostas comerciais datadas de 24 e 31 de maio de 2021

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Sorocaba 20 de Agosto de 2021
Local data

F.A.Q.

FERNANDO AUGUSTO QUEIROZ SIMONCINI - CPF: 313.373.158-00

BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A. -
CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessarlink@creasp.org.br Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$ 233,94

Registrada em: 26/08/2021

Valor Pago R\$ 233,94

Nosso Número: 28027230211230332

Versão do sistema

Impresso em: 27/08/2021 10:29:25

Recibo de Comunicação de Obra

Declarante: 059.268.147-58 - ANDERSON FERREIRA MELEGARE

Situação: Ativa

Empresa

25.224.614/0001-88 BRT SOROCABA CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS SPE S.A
ANTONIO CARLOS COMITRE, 540 ANDAR 4 SALA 45
PARQUE CAMPOLIM
18.047-620 SOROCABA / SP

Nome da Obra ou do Empreendimento

BRT SOROCABA CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS SPE S.A

Endereço Completo da Obra

RUA, Rua Capitão Bento Mascarenhas Jequitinhonha - de 1676/1677 ao fim 2170
Jardim São Carlos Referência:
18.046-495 SOROCABA / SP

Detalhamento da Obra

CNAE Classe: 4399-1 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
CNAE Subclasse: 01 Administração de obras
Descrição: Implantação e execução de Pavimentação Rígido e Flexível, compreendido pelos serviços de demolição de pavimento existente, Transporte de Material de Demolição, Destinação e Manutenção do Bota Fora (sem custo de royalties), Regularização do Subleito, Reconstrução de Base, Sub-base, Pavimento Rígido, Guias, Sarjetas, Fresagem, Transporte de Material Fresado, Serviços de Drenagem, e demais itens constantes em projeto, a serem executados no Corredor Estrutural Sul e Área Central, localizados na Aven

Obra financiada com recursos do FGTS? Sim

Previsão de início: 23/09/2019 Previsão de término: 23/03/2020

Previsão de empregados: 15 da Empresa Principal + 100 terceirizados

Observações: Empresa contratada para execução dos serviços:
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI
Contrato: 0102/2019

CORREDOR SUL E ÁREA CENTRAL

Comunicação Recebida em 13/01/2020 às 11:49:58hs

Recibo Nº 25224614.130120.114958

COMUNICAÇÃO RETIFICADORA
Número anterior 25224614.130120.111912

Recibo de Comunicação de Obra

Declarante: 059.268.147-58 - ANDERSON FERREIRA MELEGARE

Situação: Ativa

Empresa

25.224.614/0001-88 BRT SOROCABA CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS SPE S.A
DOUTOR CAMPOS SALLES, 900 GARAGEGARAGEM DE ONIBUS
VILA ASSIS
18.025-000 SOROCABA / SP

Construtor Principal

CNPJ/CEI/CPF:
Razão social/ Nome:

Nome da Obra ou do Empreendimento

BRT SOROCABA CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS SPE S.A

Dados da Obra

AVENIDA, Avenida Ipanema - de 1622/1623 a 3460/3461 540
Jardim Planalto Referência: CANTEIRO DE OBRAS
18.070-631 SOROCABA / SP
Telefone:
Email:

Detalhamento da Obra

CNAE Classe:	4399-1	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
CNAE Subclasse:	01	Administração de obras
Descrição:	Implantação e execução de pavimentação rígida e flexível do Corredor BRT Ipanema e Binário Central (Av. Comendador Oeterer e Comendador Hermelino Matarazo), Cartas Convite nº 005/2019 e nº006/2019) respectivamente, abrangendo o fornecimento de equipamentos e de mão-de-obra, bem como a gestão de compras, administração e aplicação de materiais. As obras na Avenida Ipanema compreendem o trecho entre as Estacas 0 e 306, e o Binário Central, o trecho entre as Estacas 0 e 70.	

Obra financiada com recursos do FGTS? Sim

Previsão de início: 01/02/2020 Previsão de término: 01/01/2021

Previsão de empregados: 15 da Empresa Principal + 179 terceirizados

Observações: Empresa contratada para execução dos serviços:
AIR-LESS SERRANA SERVIÇOS EIRELI
BC2
Contrato: 0098/2019

Recibo de Comunicação de Obra

Comunicação Recebida em 13/01/2020 às 11:45:59hs

Recibo Nº 25224614.130120.114559

COMUNICAÇÃO RETIFICADORA
Número anterior 25224614.130120.111405

Recibo de Comunicação de Obra

Declarante: 059.268.147-58 - ANDERSON FERREIRA MELEGARE

Situação: Ativa

Empresa

25.224.614/0001-88 BRT SOROCABA CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS SPE S.A
DOUTOR CAMPOS SALLES, 900 GARAGEGARAGEM DE ONIBUS
VILA ASSIS
18.025-000 SOROCABA / SP

Construtor Principal

CNPJ/CEI/CPF:
Razão social/ Nome:

Nome da Obra ou do Empreendimento

BRT SOROCABA CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS SPE S.A

Dados da Obra

VIELA, Viela João Emidio Correa de Moraes (Jamelão) 21
Jardim Gonçalves Referência:
18.016-519 SOROCABA / SP
Telefone:
Email:

Detalhamento da Obra

CNAE Classe: 4399-1 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
CNAE Subclasse: 01 Administração de obras
Descrição: Implantação e execução de Pavimentação Rígido e Flexível, compreendido pelos serviços de demolição de pavimento existente, Transporte de Material de Demolição, Destinação e Manutenção do Bota Fora, Regularização do Subleito, Reconstrução de Base, Sub-base, Pavimento Rígido, Guias, Sarjetas, Fresagem, Transporte de Material Fresado, Serviços de Drenagem, e demais itens constantes em projeto, a serem executados no Corredor Estrutural Leste e General Osório, localizados na Avenida São Paulo, Rua Ca
Obra financiada com recursos do FGTS? Sim
Previsão de início: 02/01/2020 Previsão de término: 02/11/2020
Previsão de empregados: 15 da Empresa Principal + 67 terceirizados
Observações: Empresa contratada para execução dos serviços:
CONSORCIO CORREDOR LESTE E GENERAL OSORIO EM
SOROCABA/SP
Contrato: 117/2019

Comunicação Recebida em 13/01/2020 às 13:10:53hs

Recibo Nº 25224614.130120.131053

Recibo de Comunicação de Obra

--
