

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

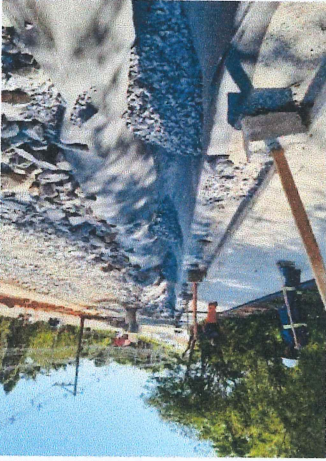


EMPRESA: TECLA CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 53.552.691/0001-00
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP
 OBRA: Duplicação da R. Pereira da Fonseca e Pavimentação da Rua Prof. Flávio de Almeida Filho
 LOCAL: SOROCABA-SP

CONTRATO: 01/08 A 31/08/2023
 PERÍODO: 01/08 A 31/08/2023
 CPL Nº: 244/2021
 7º MEDICAO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES SI/BDI	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
1.0	Projetos	R\$ 36.733,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.733,49
2.0	Serviços Preliminares	R\$ 128.320,78	R\$ 33.271,60	R\$ 5.272,37	R\$ 17.613,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.320,78
3.0	Terraplanagem	R\$ 891.004,00	R\$ 26.69%	R\$ 30.841,33	R\$ 17.891,04	R\$ 9.980,98	R\$ 12.89%	R\$ 75.437,30	R\$ 16.500,13	R\$ 2.64%	R\$ 18.20%	R\$ 94.139,99	R\$ 17.891,04	R\$ -	R\$ 981.004,00
4.0	Pavimento e Recapeamento	R\$ 6.090.934,20	R\$ 7.34%	R\$ 33.998,19	R\$ 135.175,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.165,64	R\$ 911.595,66	R\$ 15.87%	R\$ 1.44%	R\$ 1.270.233,55	R\$ 1.117.805,82	R\$ -	R\$ 6.090.934,20
5.0	Drenagem	R\$ 3.394.087,19	R\$ -	R\$ 33.952,14	R\$ 44.644,75	R\$ 12.422,89	R\$ 64.394,62	R\$ 102.210,95	R\$ 253.504,11	R\$ 7.49%	R\$ 59.228,51	R\$ 59.157,45	R\$ 59.157,45	R\$ -	R\$ 3.394.087,19
6.0	Vertedor	R\$ 159.299,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159.299,98
7.0	Aduelas Moldada In Loco	R\$ 290.976,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 290.976,37
8.0	Canal de Restituição	R\$ 879.840,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 879.840,84
9.0	Calçadas e Ciclovias	R\$ 1.228.461,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.228,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.072,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.228.461,76
10.0	Iluminação	R\$ 1.689.786,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.689.786,79
11.0	Sinalização	R\$ 298.064,79	R\$ -	R\$ 20.098,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 298.064,79
12.0	Implantação de requalificação asfáltica	R\$ 71.362,65	R\$ -	R\$ 6,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.362,65
13.0	Boleto Estacionamento Praca (1000m² - 50 Zom)	R\$ 341.480,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.764,92	R\$ 133.910,22	R\$ 98,41%	R\$ 125.000,00	R\$ 38.805,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 341.480,49
14.0	Proposta de Pavimento e Drenagem (Rua Pavimentação - Rua Almeida Filho)	R\$ 328.573,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,08%	R\$ 98.215,97	R\$ 26,69%	R\$ 83.604,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 328.573,95
16.0	Iluminação (Rua Prof. João Franco de Almeida Filho)	R\$ 981.786,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,65%	R\$ 26,17%	R\$ -	R\$ 740.426,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 981.786,89
17.0	Iluminação E CICLOVIA (Avenida Conde Zappellin)	R\$ 506.974,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 506.974,92
18.0	SERVÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 120.340,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.340,61
	Administração Local	R\$ 328.483,81	R\$ 1.511,80	R\$ 8.435,33	R\$ 4.812,20	R\$ 2.025,83	R\$ 6.703,64	R\$ 38.777,86	R\$ 7.601,45	R\$ 29.563,54	R\$ 29.563,54	R\$ 29.563,54	R\$ 29.563,54	R\$ 29.563,54	R\$ 328.483,80
	TOTAL MENSAL S/BDI	R\$ 77.865,43	R\$ 434,482,18	R\$ 237.651,69	R\$ 104.345,50	R\$ 346.271,14	R\$ 1.887.265,66	R\$ 3.914.513,12	R\$ 2.820.311,19	R\$ 3.241.997,41	R\$ 2.820.311,19	R\$ 2.820.311,19	R\$ 2.820.311,19	R\$ 2.820.311,19	R\$ 16.918.975,09
	BDI (22,04%)	R\$ 17.161,64	R\$ 86.755,46	R\$ 52.356,39	R\$ 22.927,75	R\$ 76.097,76	R\$ 440.198,13	R\$ 646.840,59	R\$ 744.470,11	R\$ 656.976,20	R\$ 656.976,20	R\$ 656.976,20	R\$ 656.976,20	R\$ 656.976,20	R\$ 3.728.953,83
	TOTAL MENSAL C/BDI	R\$ 95.026,97	R\$ 521.237,65	R\$ 289.908,08	R\$ 127.273,25	R\$ 422.368,90	R\$ 2.437.463,79	R\$ 4.561.353,71	R\$ 3.577.881,23	R\$ 3.901.515,54	R\$ 3.477.887,61	R\$ 3.477.887,61	R\$ 3.477.887,61	R\$ 3.477.887,61	R\$ 20.647.928,92
	TOTAL ACUMULADO C/BDI	R\$ 95.026,97	R\$ 625.244,87	R\$ 915.152,70	R\$ 1.042.495,95	R\$ 1.463.864,85	R\$ 3.901.515,54	R\$ 7.803.030,04	R\$ 11.374.543,28	R\$ 15.023.214,92	R\$ 18.392.896,67	R\$ 20.647.928,92	R\$ 20.647.928,92	R\$ 20.647.928,92	R\$ 20.647.928,92

Luiz Gustavo Ferreira
 Engenheiro CIVIL
 CREA 506999/1-00

Lucas Saboya
 Engº CIVIL - CREA 5070219423
 CADI - UJFP

<p>De acordo: TECLA CONSTRUÇÕES LTDA</p> <p>ENG. LUIZ GUSTAVO FERREIRA ENGENHEIRO PREPOSTO CREA Nº 506991030-SP</p> <p>De acordo: CAD. UEP</p> <p>ENG. LUCAS SAPOVA FISCALIZAÇÃO CREA Nº 5070219423-SP</p>	
<p>Desc: Execução do reforço em rachão</p>	
<p>Desc: Execução de rede de drenagem na rua perera da fONSECA</p>	
<p>Desc: espalhamento do rachao para reforço</p>	
<p>DATA: 01/09/2023</p>	<p>MES: 01/08/2023 a 31/08/23</p>
<p>CONTRATO:</p>	<p>MEDIÇÃO: 7ª</p>
<p>EMPRESA: TECLA CONSTRUÇÕES LTDA</p>	<p>PROCESSO Nº</p>
<p>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - SOROCABA - RUA PEREIRA DA FONSECA</p>	
