Prefeitura de SOROCABA

CBRT SOROCABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SUBVENÇÃO 41.2

SINALIZAÇÃO VIÁRIA (Trecho 4)

Índice:

1. Boletim de Medição Eventograma.....03

1.1 Planilha de Eventos e Serviços.....07

2. Relatório de Obras.....13

2.1 Relatório Fotográfico.....15

3. ART/SCPO.....19

4. Atestado de Qualidade.....28

5. Croquis de Projetos.....32

Prefeitura de SOROCABA

CBRT SOROCABA

1.1 BOLETIM DE MEDIÇÃO

EVENTOGRAMA

EVENTOGRAMA DE SUBVENÇÃO 41.2 - RESUMO

Prefeitura de SOROCABA

CBRTS SOROCABA

Mês de medição e pagamento	%	Recursos da Caixa Econômica Federal (R$)	Recursos da Prefeitura (R$)
M01	0,00%	0,00	0,00
M02	0,00%	0,00	0,00
M03	0,00%	0,00	0,00
M04	2,04%	2.544.123,97	133.901,26
M05	0,00%	0,00	0,00
M06	0,00%	0,00	0,00
M07	0,00%	0,00	0,00
M08	3,36%	4.197.804,56	220.937,07
M09	0,51%	636.030,99	33.475,32
M10	0,51%	636.030,99	33.475,32
M11	0,00%	0,00	0,00
Subtotal	**6,42%**	**8.013.990,51**	**421.788,97**
M12	0,20%	254.412,41	13.390,11
M13	0,00%	0,00	0,00
M14	0,00%	0,00	0,00
M15	0,00%	0,00	0,00
M16	0,20%	254.412,40	13.390,12
M17	0,00%	0,00	0,00
M18	0,00%	0,00	0,00
M19	0,41%	508.824,79	26.780,26
M20	1,73%	2.162.505,37	113.816,08
M21	0,00%	0,00	0,00
M22	4,84%	6.042.294,43	318.015,49
M23	0,00%	0,00	0,00
Subtotal	**7,39%**	**9.222.449,40**	**485.392,06**
M24	0,00%	0,00	0,00
M25	0,00%	0,00	0,00
M26	2,04%	2.544.123,97	133.901,26
M27	0,00%	0,00	0,00
M28	0,61%	763.237,19	40.170,38
M29	4,18%	5.215.454,14	274.497,58
M30	6,83%	8.522.815,31	448.569,22
M31	11,21%	13.992.681,83	736.456,94
M32	5,71%	7.123.547,11	374.923,53
M33	4,08%	5.088.247,94	267.802,52
M34	4,08%	5.088.247,93	267.802,54
M35	0,00%	0,00	0,00
Subtotal	**38,72%**	**48.338.355,42**	**2.544.123,97**
M36	5,30%	6.614.722,34	348.143,27
M37	3,72%	4.643.026,24	244.369,81
M38	10,34%	12.911.429,13	679.548,93
M39	0,41%	508.824,79	26.780,26
	0,56%	699.634,09	36.822,85
M40	0,00%	0,00	0,00
M41	0,61%	763.237,19	40.170,38
M42	0,00%	0,00	0,00

M43	0,00%	0,00	0,00
M44	0,15%	190.809,30	10.042,59
M45	0,00%	0,00	0,00
M46	1,32%	1.653.680,58	87.035,82
M47	0,00%	0,00	0,00
Subtotal	**22,42%**	**27.985.363,66**	**1.472.913,91**
M48	0,00%	0,00	0,00
M49	1,53%	1.908.092,98	100.425,54
M50	0,00%	0,00	0,00
M51	0,00%	0,00	0,00
M52	0,31%	381.618,60	20.085,18
M53	0,00%	0,00	0,00
M54	0,00%	0,00	0,00
M55	0,15%	190.809,30	10.042,59
M56	0,00%	0,00	0,00
M57	0,00%	0,00	0,00
M58	0,15%	190.809,30	10.043,02
Subtotal	**2,14%**	**2.671.330,18**	**140.596,33**
Subtotal 2022	**77,08%**	**96.231.489,16**	**5.064.815,24**
M59	0,00%	0,00	0,00
M60	0,00%	0,00	0,00
M61	0,00%	0,00	0,00
M62	0,00%	0,00	0,00
M63	0,00%	0,00	0,00
M64	0,12%	148.114,17	7.795,48
M65	0,15%	185.142,71	9.744,35
M66	0,17%	206.133,47	10.849,13
	0,17%	206.133,47	10.849,13
	0,18%	222.171,25	11.693,22
M67	0,17%	206.133,47	10.849,13
	0,18%	222.171,25	11.693,22
M68	0,17%	206.133,47	10.849,13
	0,24%	296.228,34	15.590,97
	0,90%	1.128.347,85	59.386,73
	1,21%	1.513.011,15	79.632,17
M69	0,17%	206.133,47	10.849,13
	0,18%	222.171,25	11.693,22
	1,81%	2.256.695,70	118.773,46
M70	0,68%	844.048,36	44.423,60
M71	0,45%	564.890,11	29.731,06
M72	0,74%	922.970,71	48.577,41
M73	0,07%	92.826,82	4.885,62
M74	2,32%	2.898.233,66	152.538,61
	0,12%	155.615,99	8.190,32
M75	2,32%	2.898.233,66	152.538,61
	0,12%	155.615,99	8.190,32
M76	2,32%	2.898.233,66	152.538,61
	0,12%	155.615,99	8.190,32

EVENTOGRAMA DE SUBVENÇÃO 41.2 - RESUMO

Prefeitura de SOROCABA

BRT SOROCABA

M77	2,32%	2.898.233,66	152.538,61
	0,12%	155.615,99	8.190,32
	0,27%	333.880,31	17.572,65
M78	0,00%	0,00	0,00
M79	0,00%	0,00	0,00
M80	2,32%	2.898.233,66	152.538,61
	0,12%	155.615,99	8.190,32
M81	0,00%	0,00	0,00
M82	0,00%	0,00	0,00
M83	2,69%	3.358.751,16	176.776,38
Subtotal	**22,92%**	**28.611.336,74**	**1.505.859,83**
Total	**100,00%**	**124.842.825,90**	**6.570.675,07**
		131.413.500,97	

Data: 28/05/2024

Gustavo P. Barata de Almeida
Gestão de Contratos
BRT Sorocaba

João Paulo Vilela Pereira
GPO - Sistran
Certificadora

Sérgio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente
URBES

1.1 PLANILHA DE EVENTOS E SERVIÇOS

Marco / Evento	Proporção	Valores (R$)
M01	**0,00%**	**0,00**
M02	**0,00%**	**0,00**
M03	**0,00%**	**0,00**
M04	**2,04%**	**2.544.123,97**
PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS	2,04%	
M05	**0,00%**	**0,00**
M06	**0,00%**	**0,00**
M07	**0,00%**	**0,00**
M08	**3,37%**	**4.197.804,56**
LICENÇA DE INSTALAÇÃO	1,02%	
PROJETOS DOS TERMINAIS - VITÓRIA RÉGIA / N. MANCHESTER / SÃO BENTO	1,84%	
EST. E PROJETOS - CORREDOR BRT ITAVUVU	0,51%	
M09	**0,51%**	**636.030,99**
EST. E PROJETOS - CORREDOR BRT OESTE	0,51%	
M10	**0,51%**	**636.030,99**
EST. E PROJETOS - CORREDOR BRT IPANEMA	0,51%	
M11	**0,00%**	**0,00**
M12	**0,20%**	**254.412,41**
EST. E PROJETOS - DEMAIS CORREDORES ESTRUTURAIS (LESTE, SUL E DEMAIS EIXOS)	0,20%	
M13	**0,00%**	**0,00**
M14	**0,00%**	**0,00**
M15	**0,00%**	**0,00**
M16	**0,20%**	**254.412,40**
CORREDOR SUL - INSTALAÇÃO DOS ABRIGOS DOS PONTOS DE PARADA	0,20%	
M17	**0,00%**	**0,00**
M18	**0,00%**	**0,00**
M19	**0,41%**	**508.824,79**
CORREDOR SUL - REFORMA DOS PASSEIOS	0,41%	
M20	**1,74%**	**2.162.505,37**
CORREDOR BRT ITAVUVU - CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO TRECHO 01	1,74%	
M21	**0,00%**	**0,00**
M22	**4,86%**	**6.042.294,43**
CORREDOR BRT ITAVUVU - CONSTRUÇÃO DO 1º CONJUNTO DE 3 ESTAÇÕES	2,04%	
CORREDOR BRT ITAVUVU - CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO TRECHO 02	1,53%	
TERMINAL V. RÉGIA - FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA E INSTALAÇÃO DA COBERTURA	1,28%	
M23	**0,00%**	**0,00**
M24	**0,00%**	**0,00**
M25	**0,00%**	**0,00**
M26	**2,04%**	**2.544.123,97**
CORREDOR BRT ITAVUVU - CONSTRUÇÃO DO 2º CONJUNTO DE 3 ESTAÇÕES	2,04%	
M27	**0,00%**	**0,00**
M28	**0,61%**	**763.237,19**

CORREDOR SUL - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RÍGIDO NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 01	0,61%	
M29	**4,19%**	**5.215.454,14**
CORREDOR BRT ITAVUVU - CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO TRECHO 04	1,53%	
CORREDOR BRT ITAVUVU - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGENS E RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 01	1,12%	
TERMINAL VITÓRIA RÉGIA - LIMPEZA DO TERRENO, TERRAPLANAGEM, EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE GUIAS E EXECUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO	1,53%	
M30	**6,85%**	**8.522.815,31**
CORREDOR BRT ITAVUVU - CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO TRECHO 03	1,53%	
CORREDOR BRT ITAVUVU - CONSTRUÇÃO DO 4º CONJUNTO DE 3 ESTAÇÕES	1,94%	
CORREDOR ITAVUVU - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 02	1,07%	
CORREDOR SUL - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RÍGIDO NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 02	0,61%	
TERMINAL V. RÉGIA - CONSTRUÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	1,69%	
M31	**11,24%**	**13.992.681,83**
CORREDOR BRT ITAVUVU - CONSTRUÇÃO DO 3º CONJUNTO DE 3 ESTAÇÕES	2,04%	
CORREDOR BRT ITAVUVU - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGENS E RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 03	1,07%	
CORREDOR BRT ITAVUVU - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 04	1,07%	
CORREDOR BRT ITAVUVU - REFORMA DOS PASSEIOS NOS TRECHOS 1 E 2	0,92%	
CORREDOR BRT IPANEMA - CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO DO TRECHO 01	2,04%	
CORREDOR LESTE - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RÍGIDO NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 03	0,82%	
CORREDOR SUL - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RÍGIDO NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 03	0,61%	
CORREDOR SUL - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RÍGIDO NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 04	0,61%	
CORREDOR SUL - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,41%	
DEMAIS EIXOS - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RÍGIDO NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 02	0,66%	
TERMINAL V. RÉGIA - SINALIZAÇÃO, INSTALAÇÕES GERAIS, PAISAGISMO, MOBILIÁRIO, COMUNICAÇÃO E ITS; SERVIÇOS COMPLEMENTARES, LIMPEZA E ENTREGA	0,97%	
M32	**5,72%**	**7.123.547,11**
CORREDOR BRT ITAVUVU - REFORMA DOS PASSEIOS NOS TRECHOS 3 E 4	0,97%	
CORREDOR BRT ITAVUVU - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA	2,45%	
CORREDOR LESTE - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RÍGIDO NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 02	0,82%	
CORREDOR LESTE - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RÍGIDO NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 04	0,82%	
DEMAIS EIXOS - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RÍGIDO NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 3	0,66%	
M33	**4,09%**	**5.088.247,94**
CORREDOR BRT IPANEMA - CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO DO TRECHO 02	2,04%	
CORREDOR BRT IPANEMA - CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO DO TRECHO 03	2,04%	

M34	**4,09%**	**5.088.247,93**
CORREDOR BRT IPANEMA - CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO DO TRECHO 04	2,04%	
CORREDOR BRT IPANEMA - REFORMA DOS PASSEIOS DOS TRECHOS 01 E 02	1,02%	
CORREDOR LESTE - REFORMA DOS PASSEIOS	0,66%	
CORREDOR LESTE - INSTALAÇÃO DOS ABRIGOS DOS PONTOS DE PARADA	0,36%	
M35	**0,00%**	**0,00**
M36	**5,32%**	**6.614.722,34**
CORREDOR BRT IPANEMA - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 02	1,12%	
CORREDOR BRT IPANEMA - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 03	1,12%	
CORREDOR BRT IPANEMA - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 04	1,12%	
CORREDOR BRT IPANEMA - REFORMA DOS PASSEIOS DOS TRECHOS 03 E 04	1,02%	
TERMINAL SÃO BENTO - LIMPEZA DO TERRENO, TERRAPLENAGEM, EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE GUIAS E EXECUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO	0,92%	
M37	**3,73%**	**4.643.026,24**
CORREDOR BRT IPANEMA - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 01	1,12%	
TERMINAL S. BENTO - FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA E INSTALAÇÃO DA COBERTURA	0,77%	
DEMAIS EIXOS - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RÍGIDO NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 01	0,61%	
CORREDOR LESTE - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RÍGIDO NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 01	0,82%	
CORREDOR LESTE - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,41%	
M38	**10,38%**	**12.911.429,13**
TERMINAL S. BENTO - CONSTRUÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, PISOS E PASSEIOS	1,02%	
TERMINAL S. BENTO - SINALIZAÇÃO, INSTALAÇÕES GERAIS, PAISAGISMO, MOBILIÁRIO, COMUNICAÇÃO E ITS; SERVIÇOS COMPLEMENTARES, LIMPEZA E ENTREGA	0,56%	
CORREDOR BRT IPANEMA - CONSTRUÇÃO DO 1º CONJUNTO DE 3 ESTAÇÕES	1,84%	
CORREDOR BRT IPANEMA - CONSTRUÇÃO DO 2º CONJUNTO DE 3 ESTAÇÕES	1,94%	
CORREDOR BRT IPANEMA - CONSTRUÇÃO DO 3º CONJUNTO DE 2 ESTAÇÕES	1,23%	
CORREDOR BRT IPANEMA - CONSTRUÇÃO DO 4° CONJUNTO DE 2 ESTAÇÕES	1,23%	
CORREDOR BRT IPANEMA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA	2,56%	
M39	**0,97%**	**1.208.458,88**
DEMAIS EIXOS - INSTALAÇÃO DOS ABRIGOS DOS PONTOS DE PARADA	0,41%	508.824,79
DEMAIS EIXOS - REFORMA DOS PASSEIOS	0,56%	699.634,09
M40	**0,00%**	**0,00**
M41	**0,61%**	**763.237,19**
DEMAIS EIXOS - PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, PAVIMENTO RÍGIDO NOS PONTOS DE PARADA, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 04	0,61%	
M42	**0,00%**	**0,00**
M43	**0,00%**	**0,00**
M44	**0,15%**	**190.809,30**
CORREDOR SUL - INSTALAÇÃO DE ITS	0,15%	
M45	**0,00%**	**0,00**
M46	**1,33%**	**1.653.680,58**

CORREDOR BRT IPANEMA - INSTALAÇÃO DE ITS NAS ESTAÇÕES	1,33%	
M47	**0,00%**	**0,00**
M48	**0,00%**	**0,00**
M49	**1,53%**	**1.908.092,98**
CORREDOR BRT ITAVUVU - INSTALAÇÃO DE ITS NAS ESTAÇÕES	1,53%	
M50	**0,00%**	**0,00**
M51	**0,00%**	**0,00**
M52	**0,31%**	**381.618,60**
DEMAIS EIXOS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,31%	
M53	**0,00%**	**0,00**
M54	**0,00%**	**0,00**
M55	**0,15%**	**190.809,30**
CORREDOR LESTE - INSTALAÇÃO DE ITS	0,15%	
M56	**0,00%**	**0,00**
M57	**0,00%**	**0,00**
M58	**0,15%**	**190.809,30**
DEMAIS EIXOS - INSTALAÇÃO DE ITS	0,15%	
M59	**0,00%**	**0,00**
M60	**0,00%**	**0,00**
M61	**0,00%**	**0,00**
M62	**0,00%**	**0,00**
M63	**0,00%**	**0,00**
M64	**0,12%**	**148.114,17**
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS - 4 paradas (Av. Dr. Américo de Figueiredo) Trecho 5	0,12%	148.114,17
M65	**0,15%**	**185.142,71**
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS - 5 paradas (Rua Benedito Ferreira Telles) Trecho 5	0,15%	185.142,71
M66	**0,51%**	**634.438,19**
REFORMA DOS PASSEIOS - Trecho 4	0,17%	206.133,47
REFORMA DOS PASSEIOS - Trecho 5	0,17%	206.133,47
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS - 6 paradas (Av. General Carneiro) Trecho 3	0,18%	222.171,25
M67	**0,34%**	**428.304,72**
REFORMA DOS PASSEIOS - Trecho 3	0,17%	206.133,47
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS -6 paradas (Av. General Carneiro) Trecho 4	0,18%	222.171,25
M68	**2,52%**	**3.143.720,81**
REFORMA DOS PASSEIOS - Trecho 2	0,17%	206.133,47
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS - 8 paradas (Av. Dr. Armanado Pannunzio) Trecho 2	0,24%	296.228,34
ESTAÇÕES - Santa Cruz	0,90%	1.128.347,85
FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DAS PLATAFORMAS - Terminal Ipiranga	1,21%	1.513.011,15
M69	**2,15%**	**2.685.000,42**
REFORMA DOS PASSEIOS - Trecho 1	0,17%	206.133,47
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS - 6 paradas (Av. Dr. Armanado Pannunzio) Trecho 1	0,18%	222.171,25
ESTAÇÃO - Tatiana	1,81%	2.256.695,70
M70	**0,68%**	**844.048,36**

LIMPEZA DE TERRENO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, GUIAS E PAVIMENTO RÍGIDO - Terminal Ipiranga	0,68%	844.048,36
M71	**0,45%**	**564.890,11**
EDIFICAÇÕES, PISOS E PASSEIOS - Terminal Ipiranga	0,45%	564.890,11
M72	**0,74%**	**922.970,71**
INSTALAÇÕES GERAIS, PAISAGISMO, MOBILIÁRIO, COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, LIMPEZA E ENTREGA - Terminal Ipiranga	0,74%	922.970,71
M73	**0,07%**	**92.826,82**
REFORMA DOS PASSEIOS - Tatiana	0,07%	92.826,82
M74	**2,45%**	**3.053.849,65**
PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 2	2,32%	2.898.233,66
SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 2	0,12%	155.615,99
M75	**2,45%**	**3.053.849,65**
PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 4	2,32%	2.898.233,66
SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 4	0,12%	155.615,99
M76	**2,45%**	**3.053.849,65**
PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 3	2,32%	2.898.233,66
SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 3	0,12%	155.615,99
M77	**2,71%**	**3.387.729,96**
PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Tatiana	0,27%	333.880,31
PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 1	2,32%	2.898.233,66
SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 1	0,12%	155.615,99
M78	**0,00%**	**0,00**
M79	**0,00%**	**0,00**
M80	**2,45%**	**3.053.849,65**
PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 5	2,32%	2.898.233,66
SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 5	0,12%	155.615,99
M81	**0,00%**	**0,00**
M82	**0,00%**	**0,00**
M83	**2,69%**	**3.358.751,16**
ITS - Instalação de ITS nas Estações	2,69%	3.358.751,16
TOTAL		**124.842.825,90**

Gustavo P. Barata de Almeida
Gestão de Contratos
BRT Sorocaba

João Paulo Vilela Pereira
GPO - Sistran
Certificadora

Sérgio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente
URBES

2. RELATÓRIO DE OBRAS

Prefeitura de SOROCABA

URBES
TRÂNSITO E TRANSPORTES

IMPLANTAÇÃO BRT

BRT SOROCABA

Evento:	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 4	Início da obra:	06/04/2023	Término da obra:	23/02/2024
Prazo total da obra:	Abr/23 a Fev/24	Tempo decorrido:	418	Saldo de prazo:	0
Trecho:	Trecho 4	Estaca Inicial:	126	Estaca Final:	243
Responsável técnico:	Jéssica Alves da Silva CREA: 5060673275-SP				
Data:	28/05/2024	Dia da semana:	D ☐ S ☒ T ☒ Q ☒ Q ☒ S ☒ S ☒		
Responsável:	Jéssica Alves da Silva CREA: 5060673275-SP				
Serviços:	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 4				

Gráfico de Precipitação

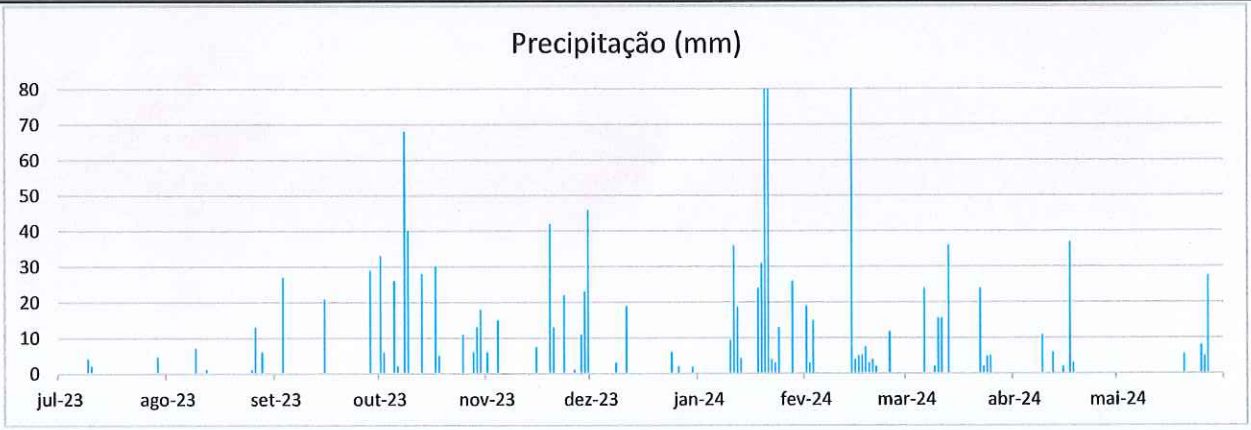

Descrição:

Gráfico de Precipitação (Fonte: INMET): Baixa incidência de precipitações entre abril e maio na região de Sorocaba.

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE	NA			

Tarefas realizadas

Descrição

Serviços de Sinalização Viária - Trecho 4:

1) Pintura de faixas, travessias e pictogramas;
2) Implantação / Substituição de placas de sinalização.

Observações Fiscalização

Equipe envolvida

Código	Descrição	Quantidade utilizada
	Auxiliar de sinalização	15
	Técnico de sinalização	8
	Encarregado	4
	Motorista	2
	Engenheiro civil	3
	Técnico de segurança	1

Equipamentos utilizados

Código	Descrição	Quantidade utilizada
	Caminhão de sinalização	7
	Máquina extrusora a quente	2

gov.br
Documento assinado digitalmente
JESSICA ALVES DA SILVA
Data: 28/05/2024 08:48:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BRT Sorocaba

Certificadora
João P. V. Pereira
Ger. Contrato
CREA Nº 5069811282-SP

URBES/ PMS

Jose Mendes Netto
Engenheiro Civil
CREA [illegible]-6

2.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

URBES
TRÂNSITO E TRANSPORTES

Prefeitura de SOROCABA

IMPLANTAÇÃO CORREDORES BRT

BRT SOROCABA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Sorocaba 28/05/2024

Execução dos Serviços

Relatório de Vistoria dos Serviços de Sinalização Viária - Trecho 4

- Sinalização horizontal e vertical - Trecho 4

Foto 01
Pintura da faixa de bordo

Foto 02
Demarcação para sinalização horizontal

Foto 03
Pintura de faixa seccionada

Foto 04
Pintura de travessia de pedestres

Visto

Sinalização horizontal e vertical - Trecho 4

Foto 05
Pintura de travessia de pedestres

Foto 06
Pintura de travessia de pedestres

Foto 07
Demarcação para sinalização horizontal

Foto 08
Instalação de placas

Visto

Sinalização horizontal e vertical - Trecho 4

Foto 09
Instalação de placa

Descrição do Serviços Executados:

- Pintura de faixas, travessias e pictogramas;
- Implantação / Substituição de placas de sinalização.

JÉSSICA ALVES DA SILVA
Engenheira Civil

3. ART / SCPO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620240853370
Substituição retificadora à 2620240843187

1. Responsável Técnico

FERNANDO AUGUSTO QUEIROZ SIMONCINI
Título Profissional: **Engenheiro Civil**
RNP: **2608638368**
Registro: **5061736616-SP**
Empresa Contratada: **2L SINALIZAÇÃO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA**
Registro: **2282057-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A.** CPF/CNPJ: **25.224.614/0001-88**
Endereço: **Rua DOUTOR CAMPOS SALLES** N°: **900**
Complemento: Bairro: **VILA ASSIS**
Cidade: **Sorocaba** UF: **SP** CEP: **18025-000**
Contrato: **428/2024** Celebrado em: **20/02/2024** Vinculada à Art n°:
Valor: R$ **2.785.440,11** Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua CLAÚDIO CASTORINO FRANÇA** N°:
Complemento: **Estação de Conexão Tatiana** Bairro: **JARDIM TATIANA**
Cidade: **Votorantim** UF: **SP** CEP: **18119-150**
Data de Início: **20/02/2024**
Previsão de Término: **20/08/2024**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
CPF/CNPJ:

Endereço: **Avenida DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO** N°:
Complemento: **Corredor Oeste** Bairro: **JARDIM VERA CRUZ**
Cidade: **Sorocaba** UF: **SP** CEP: **18050-000**
Data de Início: **20/02/2024**
Previsão de Término: **20/08/2024**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
CPF/CNPJ:

Endereço: **Avenida GENERAL CARNEIRO** N°:
Complemento: **CORREDOR OESTE** Bairro: **VILA LUCY**
Cidade: **Sorocaba** UF: **SP** CEP: **18043-004**
Data de Início: **20/02/2024**
Previsão de Término: **20/08/2024**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Execução					
1	**Execução de obra**	**de sinalização**	**viária**	**27468,50000**	**metro quadrado**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

OBJETO: Contratação de sinalização horizontal e vertical para o Corredor Oeste e Binário Américo - incluindo o Terminal Ipiranga e Estação de Conexão Tatiana. Quantidade de placas instaladas = 763 unidades e sinalização horizontal = 27.468,50 m2

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ ____ de _____ de _____

Local **data**

Fernando Augusto Queiroz Simoncini

Assinado de forma digital por Fernando Augusto Queiroz Simoncini
Dados: 2024.05.16 14:23:01 -03'00'

FERNANDO AUGUSTO QUEIROZ SIMONCINI - CPF: [redacted]

BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A. - CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ **0,00** Registrada em: **16/05/2024** Valor Pago R$ **0,00** Nosso Numero: **2620240853370** Versão do sistema

Impresso em: 16/05/2024 14:21:24

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620240899812
Substituição retificadora à 2620240690927

1. Responsável Técnico

WU YAN MING
Título Profissional: **Engenheiro Civil**
RNP: **2604908824**
Registro: **0600940240-SP**
Empresa Contratada: **VISUAL SINALIZACAO VIARIA E CONSTRUCOES LTDA**
Registro: **0513788-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**
CPF/CNPJ: **25.224.614/0001-88**
Endereço: **Rua DOUTOR CAMPOS SALLES**
N°: **900**
Complemento:
Bairro: **VILA ASSIS**
Cidade: **Sorocaba**
UF: **SP**
CEP: **18025-000**
Contrato: **435/2024**
Celebrado em: **04/04/2024**
Vinculada à Art n°:
Valor: R$ **2.000.000,00**
Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua BENEDITO FERREIRA TELLES**
N°:
Complemento: **Binário**
Bairro: **JARDIM SIMUS**
Cidade: **Sorocaba**
UF: **SP**
CEP: **18055-270**
Data de Início: **08/04/2024**
Previsão de Término: **08/07/2024**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Código:
CPF/CNPJ:

Endereço: **Rua CLAÚDIO CASTORINO FRANÇA**
N°:
Complemento: **Estação de Conexão Tatiana**
Bairro: **JARDIM TATIANA**
Cidade: **Votorantim**
UF: **SP**
CEP: **18119-150**
Data de Início: **08/04/2024**
Previsão de Término: **08/07/2024**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Código:
CPF/CNPJ:

Endereço: **Rua DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO**
N°:
Complemento: **Binário**
Bairro: **JARDIM SIMUS**
Cidade: **Sorocaba**
UF: **SP**
CEP: **18055-131**
Data de Início: **08/04/2024**
Previsão de Término: **08/07/2024**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Código:
CPF/CNPJ:

Endereço: **Avenida DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO**
N°:
Complemento: **Corredor Oeste**
Bairro: **JARDIM VERA CRUZ**
Cidade: **Sorocaba**
UF: **SP**
CEP: **18050-000**
Data de Início: **04/04/2024**
Previsão de Término: **04/07/2024**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro**
Código:

CPF/CNPJ:

Endereço: **Rua ESTADO DE ISRAEL** N°:
Complemento: **Terminal Ipiranga** Bairro: **IPIRANGA**
Cidade: **Sorocaba** UF: **SP** CEP: **18055-017**
Data de Início: **08/04/2024**
Previsão de Término: **08/07/2024**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
CPF/CNPJ:

Endereço: **Avenida GENERAL CARNEIRO** N°:
Complemento: **CORREDOR OESTE** Bairro: **VILA LUCY**
Cidade: **Sorocaba** UF: **SP** CEP: **18043-004**
Data de Início: **04/04/2024**
Previsão de Término: **04/07/2024**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro** Código:
CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Execução					
1	**Execução de obra**	**de sinalização**	**viária**	**17073,83000**	**metro quadrado**
	Execução de obra	**de sinalização**	**viária**	**410,00000**	**unidade**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA PINTURA, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Sorocaba 24 de maio de 2024
Local data

WU YAN MING: [redacted] Assinado de forma digital por WU YAN MING:00621215880 Dados: 2024.05.24 15:30:54 -03'00'

WU YAN MING - CPF: [redacted]

BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-98

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ **0,00** Registrada em: **23/05/2024** Valor Pago R$ **0,00** Nosso Numero: **2620240899812** Versão do sistema

Impresso em: 23/05/2024 17:17:45

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230231662102

1. Responsável Técnico

JESSICA ALVES DA SILVA
Título Profissional: Engenheira Civil
RNP: 2619208270
Registro: 5070628189-SP
Registro: 2194315-SP
Empresa Contratada: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A.

2. Dados do Contrato

Contratante: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.
CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88
Endereço: Rua DOUTOR CAMPOS SALLES
N°: 900
Complemento:
Bairro: VILA ASSIS
Cidade: Sorocaba
UF: SP
CEP: 18025-000
Contrato:
Celebrado em: 09/02/2018
Vinculada à Art n°: 28027230211347947
Valor: R$ 300.000.000,00
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua BENEDITO FERREIRA TELLES
N°:
Complemento:
Bairro: JARDIM SIMUS
Cidade: Sorocaba
UF: SP
CEP: 18055-270
Data de Início: 04/02/2019
Previsão de Término: 18/12/2024
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infraestrutura
Código:
Proprietário: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.
CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

Endereço: Rua CLAÚDIO CASTORINO FRANÇA
N°:
Complemento:
Bairro: JARDIM TATIANA
Cidade: Votorantim
UF: SP
CEP: 18119-150
Data de Início: 04/02/2019
Previsão de Término: 18/12/2024
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infraestrutura
Código:
Proprietário: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.
CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

Endereço: Rua DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO
N°:
Complemento:
Bairro: JARDIM SIMUS
Cidade: Sorocaba
UF: SP
CEP: 18055-131
Data de Início: 04/02/2019
Previsão de Término: 18/12/2024
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infraestrutura
Código:
Proprietário: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.
CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

Endereço: Avenida DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO
N°:
Complemento:
Bairro: JARDIM VERA CRUZ
Cidade: Sorocaba
UF: SP
CEP: 18050-000
Data de Início: 04/02/2019
Previsão de Término: 18/12/2024
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infraestrutura
Código:

Proprietário: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A. CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

Endereço: Rua ESTADO DE ISRAEL Nº:
Complemento:
Bairro: IPIRANGA
Cidade: Sorocaba
UF: SP CEP: 18055-017
Data de Início: 04/02/2019
Previsão de Término: 18/12/2024
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infraestrutura
Código:
Proprietário: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A. CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

Endereço: Avenida GENERAL CARNEIRO Nº:
Complemento:
Bairro: VILA LUCY
Cidade: Sorocaba
UF: SP CEP: 18043-004
Data de Início: 04/02/2019
Previsão de Término: 18/12/2024
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infraestrutura
Código:
Proprietário: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A. CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Elaboração					
1	Projeto	de pavimentação	asfáltica para vias urbanas	208,00000	metro cúbico
	Projeto	de terminal modal		1602,00000	metro quadrado
	Projeto	de terminal modal		104564,39000	metro quadrado
	Projeto	de edificação		91,51000	metro quadrado
	Projeto	de edificação		250,00000	metro quadrado
	Projeto	de estrutura metálica		1729,00000	metro quadrado
	Projeto	de estrutura metálica		145,00000	metro quadrado
	Projeto	de pavimentação	asfáltica para vias urbanas	4266,83000	metro cúbico
	Projeto	de pavimentação	em concreto para vias urbanas	835,20000	metro cúbico
	Projeto	de pavimentação	asfáltica para vias urbanas	1700,52000	metro cúbico
	Projeto	de pavimentação	asfáltica para vias urbanas	154,80000	metro cúbico
	Projeto	de pavimentação	em concreto para vias urbanas	111,58000	metro cúbico
	Projeto	de pavimentação	em concreto para vias urbanas	329,12000	metro cúbico
Execução					
2	Execução de obra	de pavimentação	asfáltica para vias urbanas	1700,52000	metro cúbico
	Execução de obra	de pavimentação	em concreto para vias urbanas	835,20000	metro cúbico
	Execução de obra	de edificação		250,00000	metro quadrado
	Execução de obra	de edificação		91,51000	metro quadrado
	Execução de obra	de terminal modal		1602,00000	metro quadrado
	Execução de obra	de terminal modal		104564,39000	metro quadrado
	Execução de obra	de estrutura metálica		145,00000	metro quadrado
	Execução de obra	de estrutura metálica		1729,00000	metro quadrado
	Execução de obra	de pavimentação	asfáltica para vias urbanas	4266,83000	metro cúbico
	Execução de obra	de pavimentação	asfáltica para vias urbanas	208,00000	metro cúbico

Execução 2	Execução de obra	de pavimentação	em concreto para vias urbanas	111,58000	metro cúbico
	Execução de obra	de pavimentação	em concreto para vias urbanas	329,12000	metro cúbico
	Execução de obra	de pavimentação	asfáltica para vias urbanas	154,80000	metro cúbico por segundo

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Sorocaba 27 de outubro de 2023

Local data

JESSICA ALVES DA SILVA - CPF: [redacted]

BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A. - CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ 218,54 Registrada em: 19/10/2023 Valor Pago R$ 218,54 Nosso Numero: 28027230231662102 Versão do sistema

Impresso em: 19/10/2023 13:10:15

MINISTÉRIO
DO **TRABALHO**
E **EMPREGO**

SCPO
Sistema de Comunicação Prévia de Obras

Recibo de Comunicação de Obra

Declarante: 474.703.848-55 - ANA CLARA MENDES DOS SANTOS

Situação: Ativa

Empresa

25.224.614/0001-88 BRT SOROCABA CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS SPE S.A
DOUTOR CAMPOS SALLES, 900 GARAGEGARAGEM DE ONIBUS
VILA ASSIS
18.025-000 SOROCABA / SP

Construtor Principal

CNPJ/CEI/CPF:25224614000188
Razão social/ Nome: BRT SOROCABA CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS SPE S.A

Nome da Obra ou do Empreendimento

SINALIZAÇÃO (TRECHO 4) - BRT SOROCABA CONCESSIONARIA DE SERV. PUBLICOS SPE SA

Dados da Obra

RUA, DR. CAMPOS SALLES 900
VILA ASSIS Referência: GARAGEM DE ÔNIBUS - BRT SOROCABA
18.025-000 SOROCABA / SP
Telefone: (15)03031-9510
Email: ana.santos@brtsorocaba.com.br

Detalhamento da Obra

CNAE Classe:	4399-1	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
CNAE Subclasse:	01	Administração de obras
Descrição:	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 4	

Obra financiada com recursos do FGTS? Sim

Previsão de início: 06/04/2023 Previsão de término: 23/02/2024

Previsão de empregados: 2 da Empresa Principal + 31 terceirizados

Observações: Empresas contratadas para execução dos serviços:
2L Sinalização, Comércio e Serviços Ltda. Contrato: 428/2024
Visual Sinalização Viária e Construções Ltda. Contrato: 435/2024

Comunicação Recebida em 28/05/2024 às 14:34:17hs

Recibo Nº 25224614.280524.143417

4. ATESTADO DE QUALIDADE

Sorocaba, 28 de maio de 2024.

Assunto: Atestado de qualidade de controle tecnológico referente a sinalização executada no trecho 4.

O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar anexos digitalmente, os ensaios e documentos comprobatórios da qualidade dos serviços de controle tecnológico realizados no período referente a sinalização viária do Trecho 4 – Corredor Oeste (Av. General Carneiro).

Atenciosamente,

JÉSSICA ALVES DA SILVA
Responsável Técnico

2L SINALIZAÇÃO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA.
Av. Cupecê, 1597 - Sala 02 - Jd. Prudência
São Paulo-SP Cep. 04365-000
CNPJ: 36.693.150/0001-75 - Inscrição Estadual: 128.722.535-118
Fone: +55 (11) 5563-0464 / e-mail: sinalizacao2l@gmail.com

Barueri, 16 de maio de 2024

A
BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PUBLICOS SPE S.A

Rua Dr. Carlos de Campos Sales, nº 900 - Bairro Pinheiros, CEP: 18.025-000-SOROCABA/SP

ATESTADO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

A empresa **2L SINALIZAÇÃO SERVIÇO E COMERCIO LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 36.693.150/0001-75, com sede na Av. Cupecê, nº 1597, sala 02 – Jd. Prudência, cidade: São Paulo - SP, ATESTA por meio do presente instrumento a qualidade e responsabilidade pelos serviços executados de sinalização, horizontal e vertical. Os serviços em questão foram realizados seguindo todas as normas vigentes e utilizando-se de materiais certificados.

- TRECHO 02 – BRT SOROCABA (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL)
- TRECHO 04 - BRT SOROCABA (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL)
- ESTAÇÃO DE CONEXÃO TATIANA - BRT SOROCABA (SINALIZAÇÃO HORÍZONTAL E VERTICAL)

Atenciosamente,

Engº Fernando Simoncini
Gestor de Obras

Fernando Augusto Queiroz Simoncini

Assinado de forma digital por Fernando Augusto Queiroz Simoncini
Dados: 2024.05.16 15:01:49 -03'00'

VISUAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua Sebastião Lopes, nº 59 - Cidade Nova Bonsucesso.
Guarulhos - São Paulo - CEP 07176-520
CNPJ/MF 00.018.675/0001-68 - I.E. Nº 336.569.177.118

Guarulhos, 27 de Maio de 2024.

À
BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A

ATESTADO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

A empresa Visual Sinalização Viária e Construções LTDA, devidamente inscrita no CNPJ. 00.018.675/0001-68, com sede na Rua Sebastião Lopes, 59 – Cidade Nova Bonsucesso – Guarulhos – SP ATESTA por meio do presente instrumento a qualidade e responsabilidade pelos serviços executados de sinalização horizontal e vertical. Os serviços em questão foram realizados seguindo toda as normas vigentes e utilizando-se de materiais certificados.

- TRECHO 01 (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL);
- TRECHO 02(SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL);
- TRECHO 03(SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL);
- TRECHO 04(SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL);
- TRECHO 05 (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL);
- TATIANA (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL);

Atenciosamente,

Matheus M Cantieri
Gestor de Obras

gov.br Documento assinado digitalmente
MATHEUS MASCARROZ CANTIERI
Data: 27/05/2024 13:30:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

5. CROQUIS E PROJETOS

BRT SOROCABA	GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS - GRDT	Nº GRDT

		DATA	FOLHA
PARA:	URBES Sérgio David Rosumek Barreto	28/05/2024	01/01
DE:	BRT SOROCABA		

Comentários:

REFERÊNCIA: PROJETOS BRT SOROCABA

ASSUNTO:

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS DOCUMENTOS	REV.	Nº FL	QUANT.	T.V.
1	PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (TRECHO 4)					
1.1	Armando_Pannunzio_RECAPE_BRT_290_2023	Implantação de sinalização horizontal e vertical	04	01	1	M
1.2	Armando_Pannunzio_RECAPE_BRT_290_2023	Implantação de sinalização horizontal e vertical	04	02	1	M
1.3	Armando_Pannunzio_RECAPE_BRT_290_2023	Implantação de sinalização horizontal e vertical	04	03	1	M
1.4	Armando_Pannunzio_RECAPE_BRT_290_2023	Implantação de sinalização horizontal e vertical	04	04	1	M
1.5	Armando_Pannunzio_RECAPE_BRT_290_2023	Implantação de sinalização horizontal e vertical	04	05	1	M
1.6	Armando_Pannunzio_RECAPE_BRT_290_2023	Implantação de sinalização horizontal e vertical	04	06	1	M
1.7	Armando_Pannunzio_RECAPE_BRT_290_2023	Implantação de sinalização horizontal e vertical	04	07	1	M
1.8	Armando_Pannunzio_RECAPE_BRT_290_2023	Implantação de sinalização horizontal e vertical	04	08	1	M
1.9	Armando_Pannunzio_RECAPE_BRT_290_2023	Implantação de sinalização horizontal e vertical	04	09	1	M
1.10	Armando_Pannunzio_RECAPE_BRT_290_2023	Implantação de sinalização horizontal e vertical	04	10	1	M
1.11	Armando_Pannunzio_RECAPE_BRT_290_2023	Implantação de sinalização horizontal e vertical	04	11	1	M
1.12	Armando_Pannunzio_RECAPE_BRT_290_2023	Implantação de sinalização horizontal e vertical	04	12	1	M
1.13	Armando_Pannunzio_RECAPE_BRT_290_2023	Implantação de sinalização horizontal e vertical	04	13	1	M
1.14	Armando_Pannunzio_RECAPE_BRT_290_2023	Implantação de sinalização horizontal e vertical	04	14	1	M
1.15	Armando_Pannunzio_RECAPE_BRT_290_2023	Implantação de sinalização horizontal e vertical	04	15	1	M

PROVIDÊNCIAS

(x)	INFORMAÇÃO E USO		REMETER CÓPIAS REPRODUZÍVEIS
( )	COMENTAR	( )	DEVOLVER
( )	APROVAR	( )	LIBERADO PARA CONSTRUÇÃO
( )	REVISAR	( )	LIBERADO SEM COMENTÁRIOS
( )	EMITIR PARECER TÉCNICO	( )	LIBERADO COM COMENTÁRIOS
( )	VERIFICAR	( )	LIBERADO P/ DESENVOLVIMENTO E
( )	LIBERAR	( )	DISTRIBUIR
( )	DEVOLUÇÃO	(x)	ARQUIVAR
( )	ASSINAR	( )	LIBERADO PARA LOCAÇÃO

T.V. = TIPO DE VIAS

O	ORIGINAL
C	CÓPIA
R	REPRODUZÍVEL
X	XEROX OU SIMILAR
I	MPRESSOS
M	MEIO MAGNÉTICO
W	OUTROS

OBSERVAÇÕES

Arquivos em anexo na pasta "2. Projetos" do CD-ROM

BRT SOROCABA	URBES	GPO SISTRAN
Jéssica Alves da Silva Engenheira Civil	Sérgio David Rosumek Barreto Diretor Presidente	João Paulo Vilela Pereira Certificadora

CBRT SOROCABA

Sorocaba, 28 de maio de 2024.

SÚMARIO CD BM 41.2 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 4

Prezados Senhores,

Apresentamos abaixo, um sumário referente ao CD BM 41.2 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA – Trecho 4, onde apresentamos os certificados realizados nos segmentos conforme referenciados abaixo:

1. Boletins de Medição;
2. Projetos;
3. Controle Tecnológico.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Jéssica Alves da Silva
Engenheira Civil
